

Prosjektskisse for prosjektet "Hest som næring"

1) Bakgrunn og hensikt

Det er et stort utviklingspotensial i hestenæringen, jfr. konklusjonene fra forprosjektet "Best på hest". Omfanget av hestehold er betydelig og det er økende interesse for hesteaktiviteter. Samtidig er det utfordringer knyttet til sikkerhet og turridning.

Hensikten med prosjektet er å bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring.

2) Målsetting

Prosjektets hovedmål er som følger:

"Styrke Drammensregionens aktivitetstilbud innen hest og bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring."

Dette innebærer å igangsette tiltak som bidrar til å nå følgende mål:

- **Næringsutvikling**
 - Flere fritidsaktiviteter knyttet til hest
 - Flere hesteaktiviteter innen gårdsturisme
 - Økt bruk av hest i "Inn på tunet"
 - Flere hester som brukes til hobby gjøres om til næring
- **Færre ulykker.** Øke sikkerheten og avklare ansvarsforhold
- **Færre konflikter.** Redusere antall konflikter, særlig knyttet til turridning
- **Forskriftsmessig gjødselhåndtering.** Alternative måter å utnytte og håndtere gjødsel
- **Økt bruk av hest for å pleie kulturlandskapet.** Utnytte beitearealer, unngå gjengroing, styrke jordvernet og øke bruk og vedlikehold av driftsbygninger
- **Mer regional samhandling.** Flere lokale leverandører leverer produkter og tjenester inn mot hestenæringen, oversikt over avløsere

Prosjektet skal bidra til økt kvalitet og profesjonalitet innen hestenæringen. Aktivitetene må utvikles, markedsføres og selges på en profesjonell måte for å kunne bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Prosjektet er starten på en utviklingsprosess i hestenæringen. Konkrete resultater vil oppnås i begrenset omfang i prosjektperioden, mens de store, synlige resultatene kommer på litt lengre sikt.

3) Omfang og avgrensning

Prosjektet omfatter seks av åtte kommuner i Drammensregionen: Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.


Prosjektet involverer aktører innen hestenæringen, grunneiere, næringens organisasjoner, offentlige utviklingsaktører og kompetansemiljøer (Lier vgs. avd. Jensvoll, Norsk Hestesenter mv), i den grad og det omfang det er hensiktsmessig. Alle aktører innen hestenæringen kan delta, herunder aktører som driver med hest knyttet til fritidsaktiviteter, gårdsturisme, "Inn på tunet" og trav-, galopp- og ryttersport.

Tilgjengelige ressurser setter rammer for prosjektets aktiviteter og ambisjonsnivå. Prosjektleder ansettes i en 50 % stilling. De deltakende kommunene stiller med egenandel gjennom noe arbeidsinnsats på de lokale landbrukskontorene. Det legges opp til at næringen og andre parter medvirker i prosjektets aktiviteter, der dette er relevant.

Prosjektet startes opp 1. september 2010 og avsluttes 31. august 2012.

4) Organisering av arbeidet

Arbeidet organiseres om følger:

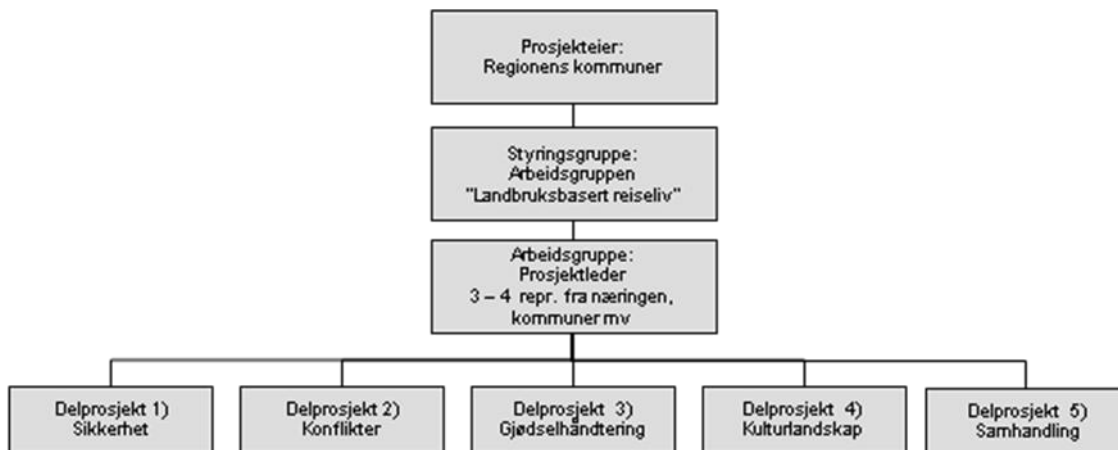

Arbeidsgruppen skal ha bred forankring i næringen og sikre at prosjektet drives målrettet og med god fremdrift. For å sikre at det arbeides effektivt med prosjektets temaer, etableres det delprosjekt som arbeider parallelt. Delprosjektene skal drives av små, smidige grupper som involverer de viktigste interessentene, og de nedlegges etter hvert som de har nådd sine mål. Delprosjektene må mobilisere sentrale aktører, slik at løsninger/tiltak kan gjennomføres.

Arbeidsgruppe: Gruppen ledes av prosjektleder og består av 4-5 representanter for hestenæringen, kommunene, og evt. andre. Gruppen har overordnet ansvar for at prosjektets mål oppnås. Gruppen skal kartlegge aktørene i hestenæringen, herunder navn og virksomhetens type og omfang. I tillegg skal gruppen jevnlig arrangere møteplasser, som skal gi faglig påfyll, utveksle erfaringer, inspirere deltakerne til videre utvikling og ta opp prosjektets temaer.

Delprosjekt 1 - Sikkerhet: Kartlegge sikkerhetsrutiner og avklare ansvarsforhold når det gjelder fritidstilbud, gårdsturisme og "Inn på tunet". Innhente informasjon og tips fra andre. Utvikle og iverksette tiltak for å bedre sikkerheten.

Delprosjekt 2 - Konflikter: Gjelder konflikter knyttet til turridding; etterlatenskaper på gang- og sykkelveier, nedtråkking av turstier og private veier mv. Konkretisere problemstillingen, innhente informasjon og tips fra andre, og for å redusere konflikter.

Delprosjekt 3 - Gjødselføring: Kartlegge omfanget av problemet, innhente informasjon og tips fra andre, og utvikle og iverksette tiltak for å håndtere gjødselføring på forskriftsmessig måte.

Delprosjekt 4 – Kulturlandskap: Kartlegge grunneiere som ønsker hest som beitedyr og aktuelle hesteeiere, og utvikle en metode ("beitebørs") for å koble disse. Innhente informasjon og tips fra andre angående vedlikehold eller restaurering av låve eller andre driftsbygninger.

Delprosjekt 5 – Samhandling: Kartlegge kommunenes leverandører av fôr og andre produkter eller tjenester til hestenæringen, og utvikle en metode for å oppnå mer samhandling i regionen. Kartlegge hesteeiere som ønsker avløser og personer som kan stille opp som avløsere, og utvikle en metode for å koble disse.

5) Fremdriftsplan

	1. halvår, år 1	2. halvår, år 1	1. halvår, år 2	2. halvår, år 2
Tiltak	<ul style="list-style-type: none"> Etablere prosjektorganisasjon Kartlegge aktører i hestenæringen Etablere møteplass Delprosjektene kartlegger nå-situasjon og setter mål for arbeidet 	<ul style="list-style-type: none"> Avholde møteplasser Delprosjektene utvikler og evt. iverksetter tiltak 	<ul style="list-style-type: none"> Avholde møteplasser Delprosjektene iverksetter tiltak 	<ul style="list-style-type: none"> Avholde møteplasser Delprosjektene iverksetter tiltak og sørger for at målene oppnås
Milepæler	Prosjektorganisasjon er på plass, med godt eierskap og god driv Avholdt 1 møteplass Hvert delprosjekt har fremdriftsplan med tydelige mål	Avholdt 2 møteplasser Delprosjektene har utviklet tiltak som er effektfulle og gjennomførbare	Avholdt 2 møteplasser Delprosjektene har iverksatt tiltakene	Avholdt 2 møteplasser Delprosjektene har iverksatt tiltakene, med gode resultater

6) Mål

Prosjektet legger grunnlaget for en utviklingsprosess i hestenæringen. Det settes inn tiltak som bidrar til forankring, eierskap og mobilisering. Disse tiltakene gir ikke synlige resultater på kort sikt, men er avgjørende for å få en solid plattform som gir gode, konkrete resultater på lengre sikt.

Ved prosjektets avslutning 31. august 2012 skal følgende være oppnådd:

- Styrket fellesskap blant aktørene i hestenæringen
- Møteplassen videreføres, med næringen som drivkraft
- Økt næringsutvikling i hestenæringen mht. fritidstilbud, gårdsturisme, "Inn på tunet"
 - Ved oppstart kartlegges sentrale måltall (eks. antall hester, årsverk, omsetning), via spørreundersøkelse, registre mv.
 - Et ½ år før avslutning gjentas undersøkelsen for å se utviklingen
- Iverksatt sikkerhetstiltak som bidrar til å redusere antall ulykker
- Iverksatt tiltak som bidrar til å redusere omfanget av konflikter
- Iverksatt tiltak som bidrar til mer forskriftsmessig håndtering av gjødsel
- Etablert en velfungerende beitebørs
- Etablert en velfungerende metode for mer lokal samhandling mellom leverandør/kunde
- Etablert en velfungerende metode vedrørende avløsertjeneste

7) Budsjett og finansiering

Prosjektets budsjetterte kostnader per år fordeler seg som følger:

1) Kommunene	kr 180.000	(2 kommunekontakter, totalt 30 % stilling)
2) Styringsgruppe	kr 5.000	(regionrådets arb.gruppe "Landbruksbasert reiseliv")
3) Arbeidsgruppe	kr 25.000	(4 -5 repr. for næring, kommuner, og evt. andre)
4) Delprosjekter	kr 60.000	(sikkerhet, konflikter, gjødsel, landskap, samhandling)
5) Prosjektleder	kr 300.000	(50 % stilling, inkl. sosiale kost, PC, telefon, husleie)
6) Møteplasser	kr 50.000	(foredragsholdere, servering mv)
7) Tiltak	kr 20.000	
8) Diverse	kr 10.000	(møter, reisekostnader mv)
<u>Budsjetterte kostnader</u>	<u>kr 650.000</u>	

Postene 1) – 4) er egeninnsats og tilsvarer kr 270.000 (timepris kr 400).

Det legges opp til følgende finansiering per år:

Egeninnsats	kr 270.000
<u>Ekstern finansiering</u>	<u>kr 380.000</u>
<u>Budsjetterte inntekter</u>	<u>kr 650.000</u>

Det søkes om ekstern finansiering på kr 380.000 per år, til sammen kr 760.000 over 2 år.
